


KLOSTERPARKEN, RINGSTED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PARADIGMA)

RENOVERING AF SVALEGANGE

Totalentreprise

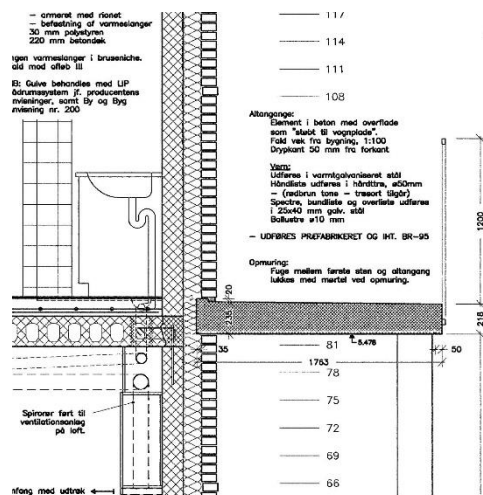

Paradigma for Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS

Dateret: 12.04.2018

Indhold:

1.	Orientering om byggesagen	4
1.1	Generelt	4
1.2	Entrepriser/arbejder	4
1.3	Bygherreleverancer	4
2.	Organisation	5
3.	Sikkerhed og sundhed	6
3.1	Plan for sikkerhed og sundhed	6
3.2	Sikkerhedsmøder	6
3.3	Kontrol og tilsyn	6
3.4	Arbejds miljø	6
3.4.1	Generelt	6
3.4.2	Begrænsning af støjgener	6
3.4.3	Begrænsning af skader og gener fra vibrationer	6
3.4.4	Begrænsning af støvgener	7
3.4.5	Begrænsning af ergonomiske gener	7
3.5	Forholdsregler ved farlige arbejder	7
3.6	Omgivende miljø	7
3.6.1	Generelt	7
3.6.2	Støj	7
3.6.3	Vibrationer	7
3.6.4	Støv	7
3.6.5	Emissioner til atmosfæren	7
3.6.6	Spild af olie og kemiske produkter	7
4.	Byggeplads	8
4.1	Generelt	8
4.2	Bestemmelser	8
4.2.1	Generelt	8
4.2.2	Myndighedsforskrifter	8
4.2.3	Myndighedstilladelser og anmeldelser	8
4.2.4	Håndtering af materialer og produkter	8
4.3	Eksisterende forhold	8
4.4	Byggepladsens indretning	8
4.4.1	Byggepladstegning	8
4.4.2	Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning	9
4.4.3	Aflukning	9
4.4.4	Vagtordning	9
4.4.5	Tyverisikring	9
4.4.6	Skiltning	9
4.4.7	Førstehjælpskasser	10
4.4.8	Brandslukningsmateriel	10
4.5	Byggepladsens færdselsarealer	10
4.5.1	Parkering	10
4.5.2	Udendørs færdselsarealer	10
4.5.3	Færdselsarealer i bygninger	10
4.5.4	Afdækning af huller i færdselsarealer	11
4.5.5	Etablering af rækværk i færdselsarealer	11
4.5.6	Belysning af færdselsarealer	11

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	3/19

4.5.7	Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer	12
4.5.8	Oprydning og renhold af færdselsarealer	12
4.6	Skurby og oplagsplads	12
4.6.1	Skurforhold	12
4.6.2	Oplagsplads	13
4.6.3	Teltværksteder	13
4.6.4	Affaldshåndtering og affaldscontainer	13
4.6.5	Belysning i skurby og på oplagsplads	13
4.6.6	Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads	14
4.6.7	Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads	14
4.7	Arbejdsområder	14
4.7.1	Afdækning af huller i arbejdsområder	14
4.7.2	Etablering af rækværk i arbejdsområder	14
4.7.3	Belysning i fælles arbejdsområder	15
4.7.4	Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder	15
4.7.5	Oprydning og renhold i arbejdsområder	15
4.8	Tekniske hjælpemidler	15
4.8.1	Kraner og materielhejse	15
4.8.2	Personelevator	16
4.8.3	Stillads og arbejdsplatforme	16
4.9	Forsyning til byggeplads	16
4.9.1	Vand og afløb	16
4.9.2	El	17
4.9.3	Kommunikation	17
5.	Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan	18
5.1	Tidsplan	18
5.2	Byggepladstegning	18
6.	Risiko vurdering	18
6.1	Arbejds miljø	18
7.	Særlige forhold - projektspecifikke	19

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 4/19

1. Orientering om byggesagen**1.1 Generelt**

<Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 1.2.1 >

1.2 Entrepriser/arbejder

<Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 1.2.2 >

1.3 Bygherreleverancer

<Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 1.2.3>

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	5/19

2. Organisation

Bygherren har udpeget totalentreprenøren til at varetage rollen som sikkerhedskordinator som også er arbejdsmiljøkordinator. Sikkerhedskordinatoren har pligten til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt pligten til at koordinere sikkerhedsarbejdet. Dette i det omfang bemanning m.v. kræver sådanne iværksættelser jf. bekendtgørelsen og AT's regler.

Byggesagens parter er følgende:

Bygherre: M. Goldschmidt Ejendomme A/S

Byggeledelse: LeanDesign ApS

Sikkerhedskordinator: Totalentreprenør (Udfyldes senere)

Miljøansvarlig: Totalentreprenør

Fagtilsyn: Totalentreprenør

Projektleder: (Udfyldes senere)

Entreprenør: (Udfyldes senere)

Arbejdstilsynet:

Politiet:

BEMÆRK:

Hvor der i det følgende er nævnt sikkerhedskordinator er dette også arbejdsmiljøkordinatoren – og omvendt, hvis rolle, arbejde m.v. overdrages fra bygherre til:

_____ efter kontraktindgåelse af de udbudte fagentrepriser og iværksættes i det omfang, loven herom kræver dette. Med det menes der, at der altid vil være nævnte ansvarlige for arbejdsmiljøet som helhed (fællesarealer) mens det er den enkelte fagentreprenør, der har det fulde ansvar og egne arbejdsområder og egen entreprise, herunder egne og kontrahe-rede (UE) håndværkere.

Denne (nærværende) PSS er til arbejdsmiljøkordinatorens færdigudfyldelse.

I det følgende vi der stå BSB som forkortelse af Byggesagsbeskrivelsen og ARB som forkortelse af Arbejdsbeskrivelsen.

Sprog:

Det er af sikkerhedsmæssige årsager at medarbejdere på pladsen kan tale, forstå og læse dansk.

Medarbejdere:

Alle medarbejdere der arbejder med nedrivningsarbejdet har været på kursus og fået kursus indenfor sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold som udførelse.

Hvis tilsynet opdager, at ovennævnte ikke overholdes, vil pladsen blive stoppet indtil det korrekte personale er på pladsen. Der godtgøres ikke herfor – hverken tidsmæssigt eller økonomisk.

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	6/19

3. Sikkerhed og sundhed

3.1 Plan for sikkerhed og sundhed

Entreprenøren skal udføre sikkerhedskoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed, forkortet som PSS (nærværende). Forud for denne PSS foreligger en risikovurdering af projektet som grundlag for vurdering af risici ved projektet mens det er under projektering – dette som erstatning for PSS – alene under projektering.

3.2 Sikkerhedsmøder

Sikkerhedskoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøde samt udarbejder referat. Samtlige firmaer på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig samt en medarbejdersikkerhedsrepræsentant, hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe. Der holdes sikkerhedsmøde hver 14. dag – når omfanget af arbejdet og bemanningen kræver dette. Det er dog til en hver tid sikkerhedskoordinatoren, der har retten og pligten til at indkalde til møde uagtet om loven kræver det eller ikke.

3.3 Kontrol og tilsyn

Det påhviler den enkelte fagentreprenør, at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation og lignende og at føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltningen/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og forelægges sikkerhedskoordinatoren på sikkerhedsmødet. Eksempelvis skal der særlig fokus på miljøsanering, hvor arbejdsmiljøet her skal sikres med daglig kontrol af forholdene.

Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og sikkerhedskoordinatoren orienteres om det.

Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt. Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra sikkerhedskoordinatoren.

3.4 Arbejdsmiljø

AT regler men også vejledninger skal følges, herunder Bar-ba.

3.4.1 Generelt

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 5.3.1

3.4.2 Begrænsning af støjgener

Entreprenøren skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen.

3.4.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer

Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, eller anvende metoder til at ophæng værktøjet, så det ikke håndholdes.

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	7/19

3.4.4 Begrænsning af støvgener

Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt.

3.4.5 Begrænsning af ergonomiske gener

Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler.

3.5 Forholdsregler ved farlige arbejder

De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer, når substitution ikke er mulig. Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for sikkerhedskoordinatoren. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne.

Da det er nedrivning, som fagentreprise og at denne omfatter miljøsanering, gælder det, at forholdsregler jf. 3.5 omfatter eksisterende forhold, bygningsdele m.v.

3.6 Omgivende miljø**3.6.1 Generelt**

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 6.1., ARB 2.6

3.6.2 Støj

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 6.2., ARB 2.6

3.6.3 Vibrationer

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 6.3., ARB 2.6

3.6.4 Støv

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 6.4., ARB 2.6

3.6.5 Emissioner til atmosfæren

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 6.5., ARB 2.6

3.6.6 Spild af olie og kemiske produkter

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 6.6., ARB 2.6

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 8/19

4. Byggeplads

4.1 Generelt

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.1

4.2 Bestemmelser

4.2.1 Generelt

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.2.1

4.2.2 Myndighedsforskrifter

Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1 og 2 og 10b udgivet af Dansk Brandteknisk Institut nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

4.2.3 Myndighedstilladelser og anmeldelser

De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser.

Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet, når der er krav om det.

Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse.

4.2.4 Håndtering af materialer og produkter

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.2.4

4.3 Eksisterende forhold

Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge ledningsejerregisteret (LER) inden arbejdet opstartes.

Entreprenøren skal kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER.

Hvis gas-, vand-, afløbsledninger samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og ansvar.

De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning <x>.

Byggepladstegning udføres af entreprenøren

Fagentreprenøren indhenter følgende ledningsoplysninger:

Spildevand, regnvand

Forsyninger (el. og gas)

Antenne

Forsyning Helsingør = Varme,

SEAS NVE = EL,

DONG = gas

4.4 Byggepladsens indretning

4.4.1 Byggepladstegning

Sikkerhedskoordinatoren forestår ajourføringen af byggepladstegningen.

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	9/19

4.4.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning

Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen.

Byggepladsens afgrænsning er vist på byggepladstegning nr. <x>.

Fagentreprenøren 02. Byggeplads etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner hegnet. Omfanget af byggepladsindhegningen fremgår af tegning nr. <x>.

Byggepladshegnet har en højde på 2m. Hegnet udføres af egnet (tråd) materialer. Etableringen finder sted i henhold til udbudstidsplanen.

Det påhviler hver enkelt fagentreprenør at sikre at tredjemand eller dennes ejendom ikke lider skade ved entreprenørens arbejde eller færdsel på byggeområdet. Fagentreprenøren 02. Byggeplads opsætter, vedligeholder og fjerner afskærmning i skellinjen. Afskærmningen udføres som en tæt pladevæg i vandfast krydsfiner i en højde på 1,2 m. Pladerne fastgøres til nedgravede stolper pr. 1,2 m i det omfang det er nødvendigt.

4.4.3 Aflukning

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.6.3

Interimslukning

Fagentreprenøren der arbejder på projektet mindst 2 dage om ugen etablerer, vedligeholder, nedtager og bortskaffer en interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med cylinder i låsesystemet. Der leveres i alt 2 nøgler til hver fagentreprenør – det er byggeplads

Aflåsning

Fagentreprenøren forestår den daglige åbning kl. <x> og aflukning kl. <x> af byggepladsen.

4.4.4 Vagtordning

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.6.4

4.4.5 Tyverisikring

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.6.5

4.4.6 Skiltning

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.6.6

Forbuds- og påbudsskilte

Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning for egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde.

Fagentreprenøren leverer og opsætter følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning:

<x> stk. skilte med teksten "Hjelm påbudt".

<x> stk. skilte med teksten "Uvedkommende ingen adgang".

<x> stk. skilte med teksten "<x>".

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	10/19

Der anvendes dragter, masker, handler, briller, høreværk og åndedrætsværn i det daglige som er indeholdt i tilbud. Endvidere forefindes samme til min. 4 personer (bygherren).

Derudover skal fagentreprenøren 01. Nedrivning leverer og vedligeholde skilte med synliggørelse af og teksten om: farligt arbejde, farligt affald samt adgang forbudt – disse gruppe af skilte der stå 3 steder på terræn foran arbejdssted.

4.4.7 Førstehjælpkasser

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.6.7

Hver entreprenør leverer forbindingskasse og har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil.

Forbindingskassen opbevares tilgængeligt i mandskabsskuret – skal i øvrigt været tydeligt skiltet.

4.4.8 Brandslukningsmateriel

Hver enkelte entreprenør skal selv sørge for nødvendigt brandslukningsudstyr for egne arbejder. Skal i øvrigt være tydelig skiltet.

4.5 Byggepladsens færdselsarealer

4.5.1 Parkering

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.7.1

Privatparkering skal vises på byggepladstegning.

4.5.2 Udendørs færdselsarealer

De udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegningen.

Byggepladsvejene kan forudsættes anvendt til tunge transportere fx elementvogne, jordtransportere og betonkanoner. De kan desuden forudsættes afvandet og vejrligssikret i fornødent omfang.

De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen.

Fagentreprenøren 02. Byggeplads etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplan og byggepladstegning.

4.5.3 Færdselsarealer i bygninger

Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen før denne har frigivet bygningerne til nedrivning.

Fælles færdselsarealer i bygningerne og byggegrube udgøres af:

<x> stk. interimstrapper

<x> stk. interimsgangbroer

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	11/19

samt arealer som efter byggeriets færdiggørelse udgør interne gange, korridorer, trapper m.m. i bygningen.

Fagentreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning af interimstrapper, -gangbroer m.m. i det omfang det er nødvendigt.

Trapper og gangbroer kan belastes med op til 300 kg/m². De interimistiske trapper og gangbroer vil i løbet af byggeperioden blive erstattet af de permanente konstruktioner.

4.5.4 Afdækning af huller i færdselsarealer

Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde mv. afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Afmærkes tydeligt.

Ansvar for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen.

Eventuel midlertidig fjernelse, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør.

Fagentreprenøren sørger for afdækning af brønde i adgangsveje - herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækningen, når de permanente dæksler monteres.

4.5.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer

Der opsættes rækværker langs alle færdselsarealer, hvor der er et niveauspring på mere end 2 m. Arbejde på tage sker med faldsikring og rækværker. Adgang sker ved trappetårne.

Endvidere opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis fald til omgivende underlag er forbundet med særlig fare.

Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter endt arbejde.

Fagentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer som angivet på byggepladstegning nr. <x>.

4.5.6 Belysning af færdselsarealer

Omfanget af byggepladsbelysningen skal fremgå af byggepladstegningen.

Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder.

Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster.

Fagentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner belysning af færdselsarealer, og på fælles stilladser.

Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram og gangreserve.

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 12/19

4.5.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer

Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.

Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse – dette bliver dog ikke tilfældet her.

Fagentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer, og på fælles stilladser.

Ved arbejde i mere end 2 meters gravedybder foretages der rækværker omkring udgravningen – dette svømmebassin og kælder under gymnastiksal.

4.5.8 Oprydning og renhold af færdselsarealer

Fagentreprenøren skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige.

Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på færdselsarealerne, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse - også hvis spildet sker uden for byggepladsen. Entreprenøren skal efter behov dog mindst en gang om ugen - normalt på ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre herunder støvsuge efter egne aktiviteter.

Byggeledelsen kan pålægge en entreprenør at koordinere oprydning og renhold med eventuelle andre entreprenører i et fælles område.

Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

Fagentreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal ske mindst en gang om dagen.

4.6 Skurby og oplagsplads**4.6.1 Skurforhold**

Skurbyens placering skal fremgå af byggepladstegningen.

Placering af de enkelte entreprenørers skure aftales med byggeledelsen, hvis ikke andet er angivet.

Fagentreprenøren 02. Byggeplads leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører i hele byggeperioden: Skurvogne til 10 personer med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads.

Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. Skuret skal indeholde møderum mv. til 10 personer samt 1 separate kontorer med 2 stk. kontorpladser. Skuret skal have toilet, håndvask og køleskab – såfremt det kræves – ikke indeholdt i udbud.

Desuden hvor der er miljøsanering, vil en der leveres og vedligeholdes en miljøvogn for korrekt omklædning m.v.

Renovering af svalegange	Dato	:	12.04.2018
Udbudsprojekt	Rev.dato:		00
Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)	Side	:	13/19

Fagentreprenøren sørger for det daglige renhold af skure, og står for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder.

Retablering af terræn efter skurby foretages af <x>entreprenøren.

4.6.2 Oplagsplads

Oplagspladsers placering skal fremgå af byggepladstegningen. Dette gælder også affaldscontainere mv.

Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede oplagsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted.

Fagentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning, som udarbejdes af Fagentreprenøren og som inden anvendelse godkendes af bygherren, viste oplagspladser. Belægningen på oplagspladserne er fliser/SF sten eller anden hård belægning, der kan blive beskadiget.

4.6.3 Teltværksteder

Teltværksteder kan kun tillades etableret af de enkelte entreprenører i det omfang, dette fremgår af byggepladstegningen.

4.6.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer

Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser mv. og henlægge affaldet i containere eller bortkøre det direkte.

Alle entreprenører skal sortere og behandle bygningsaffald i henhold til de kommunale regler herom.

Containere placeres i henhold til byggepladstegningen i tilknytning til kørearealer.

Fagentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner og tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse.

Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner:
Jf. kommunens anvisninger.

Særligt gælder det for miljøsanering, at bortkørsel af forurenede som farligt affald sker i lukkede egnede og godkendte containere, emballageret og bortkørt til modtagerstation anvist af kommunen.

Emballage mv. skal slås sammen og anbringes i containere, så det fylder mindst muligt.

4.6.5 Belysning i skurby og på oplagsplads

Fagentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegningen med minimum 25 lux i skurby og på oplagsplads.

Byggepladsbelysningen skal være virksom fra 1. september til 1. maj og derfor uden for nærværende.

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 14/19

4.6.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads

Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.

Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse.

Fagentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads.

4.6.7 Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads

De enkelte entreprenører har pligt til løbende at foretage oprydning og renhold på deres respektive oplagspladser.

Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

4.7 Arbejdsområder**4.7.1 Afdækning af huller i arbejdsområder**

Huller og udsparinger i arbejdsområder såsom etagedæk, tagflader mv. afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt.

Ansvar for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der monterer bygningsdelen/udfører hultagningen.

Eventuel midlertidig fjernelse af, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør.

Fagentreprenøren afdækker skakthuller og udsparinger i dæk.

Fagentreprenøren afdækker udsparinger i tagdæk.

4.7.2 Etablering af rækværk i arbejdsområder

Rækværker opsættes langs alle frie dækkanter, hvor arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladsgulve, gangbroer mv. ligger mere end 2 m over terræn.

Endvidere opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis fald til angivne underlag er forbundet med særlig fare.

Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter endt arbejde.

Fagentreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i arbejdsområder.

De enkelte entreprenører sørger for rækværker på egne arbejdsplatforme, stilladsdæk, mv.

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 15/19

Afmærkninger, rækværker og sikring omkring og af udgravninger. Der er dybe udgravninger ved jordforurening, olietank, svømmebassin og kælder under gymnastiksal.

4.7.3 Belysning i fælles arbejdsområder

Entreprenøren skal selv sørge for belysning til brug for udførelse af eget arbejde i arbejdsområder.

4.7.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder

Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.

Vinterforanstaltninger som nævnt nedenfor vurderes ikke aktuelt

Snerydning og tilsvarende arbejder skal så vidt muligt foretages inden normal arbejdstids begyndelse.

Fagentreprenøren sørger for interimsopvarmning og udtørring af bygning.

Fagentreprenøren sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder – bliver dog ikke aktuelt her.

4.7.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder

Det påhviler hver enkelt entreprenør til stadighed at holde arbejdsområderne ryddelige og rengjorte for affald, materialer og værktøj samt flytte eller fjerne samme, hvis det er hindrende for byggeriets fremme.

Entreprenøren skal efter behov dog mindst en gang om ugen - normalt på ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre herunder støvsuge efter egne aktiviteter.

Byggeledelsen kan pålægge en entreprenør at koordinere oprydning og renhold med eventuelle andre entreprenører i et fælles arbejdsområde.

Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

4.8 Tekniske hjælpemidler**4.8.1 Kraner og materielhejse**

Den enkelte entreprenør skal selv sørge for kraner og materialehejse til eget brug udover eventuelle fælles kraner og materialehejse.

Hvis entreprenøren ønsker at benytte kran og/eller materialehejse udover det, der er angivet i udbudsmaterialet, skal entreprenøren skriftligt redegøre herfor. Redegørelsen skal omfatte ønske til placering, oplysninger om strømforsyning, sikkerhedsmæssige foranstaltninger, og periode for kranens opstilling. Redegørelsen skal foreligge inden koordineringsmøde for byggeplads.

Opstilling af kraner og materialehejse må kun ske efter aftale med byggeledelsen.

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 16/19

Fagentreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner materialehejs jf. byggeplads-tegning nr. <x>. Materialehejsen er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i peri-oden <x>. Materialehejsen kan løfte <x> kg og har målene <x gange y> dette er ikke aktuelt.

4.8.2 Personelevator

Fagentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner personelevator jf. bygge-pladstegning nr. <x>. Personelevatoren er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i perioden <x>. Dette er ikke aktuelt.

4.8.3 Stillads og arbejdsplatforme

Den enkelte entreprenør skal selv sørge for stilladser til eget brug udover eventu-elle fællesstilladser.

Opstilling og nedtagning af stillads og arbejdsplatform skal ske efter aftale med byggeledelsen.

Stilladser skal forsynes med tydelig skiltning hvoraf fremgår opstiller, lejer og tilla-delig belastning.

Entreprenøren skal medvirke til at rationalisere den samlede byggeplads ved at til-lade andre entreprenører at benytte stilladserne, når dette er hensigtsmæssigt og kan ske uden væsentlige gener for opstiller/lejer, og uden at stilladserne lider overlast. Entreprenøren er pligtig til i god tid at træffe aftale herom med byggele-delsen. Fagentreprenøren opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner fællesstil-lads. Omfanget af fællesstilladset fremgår af byggepladstegningen. Stilladset er type <x> og stilladsklasse <x> ikke aktuelt.

Stilladset stilles til rådighed for alle entreprenører i forbindelse med følgende arbej-der:

Adgang til tage

Tagarbejder

Kælder

Stilladset vil være til rådighed i perioden <x>.

Byggeledelsen koordinerer arbejderne på fællesstillads.

4.9 Forsyning til byggeplads**4.9.1 Vand og afløb**

Der etableres det på byggepladstegningen anførte antal tapsteder.

De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af vand og afløb til egne skure. Tilslutning sker fra tapsteder og afløbsstudse vist på byggepladstegningen.

Tilslutningen skal udføres, så denne er vintersikret.

Fagentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører.

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 17/19

Bemærk, der arbejdes med farligt affald, hvorfor bad, omklædning m.v. skal følge reglerne herom.

Fagentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby som vist på byggepladstegning nr. <x>.

Fagentreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af Fagentreprenøren, hvis de efter tidsplanen skal opretholdes i vinterhalvåret –

Ikke aktuelt for perioden.

4.9.2**EI**

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.11.2

Der etableres de på byggepladstegningen viste eltavler.

De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af eget elmateriel til tavlerne.

Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen.

De enkelte entreprenører skal hver dag ved arbejdets ophør frakoble egne undertavler.

Fagentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører.

Fagentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskur.

Tilsvarende forsyninger til egne skure, materialecontainere mv. udføres af de enkelte entreprenører.

Fagentreprenørene ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationerne angivet på byggepladstegning.

4.9.3**Kommunikation**

Vil blive inden byggestart sammenskrevet med projektspecifikke BSB punkt 4.11.3
Hver entreprenør må selv foranledige og bekoste oprettelse af abonnement, tilslutning og drift af telefon.

Fagentreprenøren sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefonlinje til brug for nødopkald.

Placering af telefon fremgår af byggepladstegningen.

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 18/19

5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan

5.1 Tidsplan

Udarbejdes af byggeledelsen som bilag hertil.

5.2 Byggepladstegning

Udarbejdes af byggeledelsen som bilag hertil.

Endvidere skal udføres byggepladstavle med synlig kontaktperson med telefonnummer, evakueringsplan og byggepladsplads.

6. Risiko vurdering

6.1 Arbejdsmiljø

Efter Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø -liste over særlige risici og andre særlige forhold

Særlige risici

- 1) Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser.
- 2) Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol.
- 3) Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom.
- 4) Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
- 5) Arbejde, der indebærer fare for drukning.
- 6) Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
- 7) Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning.
- 8) Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr.
- 9) Arbejde i trykkammer.
- 10) Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer.
- 11) Arbejde under forhold, hvor der er risiko for eksplosion i øvrigt.
- 12) Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer.
- 13) Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der kan indebære en brand- eller eksplosionsfare.
- 14) Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der er sundhedsfarlige.

Andre særlige forhold

- 1) Arbejde i snævre rum eller under særligt snævre pladsforhold i øvrigt.
- 2) Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter.
- 3) Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer.
- 4) Arbejde under særligt uhygiejniske forhold.
- 5) Arbejde under forhold, der kan medføre udsættelse for farlige mængder af statisk elektricitet.

Bilag 2

Renovering af svalegange

Dato : 12.04.2018

Udbudsprojekt

Rev.dato: 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed (Paradigma)

Side : 19/19

Generelle forebyggelsesprincipper

(Jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet)

1) Forhindring af risici.

2) Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

3) Bekæmpelse af risici ved kilden.

4) Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet.

5) Hensyntagen til den tekniske udvikling.

6) Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.

7) Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet.

8) Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse.

9) Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

7. Særlige forhold - projektspecifikke

Her indskrives for sagen gældende særlige forhold:

For sagen gældende vurderes bemanning af være 3-4 mand i perioden, hvorfor ikke det fritager nogle i ikke at overholder en hver form for arbejdsmiljøregel, men alene rytmen i sikkerhedsmøder, sikkerhedsorganisering og omfanget af dokumenter som vedligeholdelsen af disse vil ske som var bemanningen større.

Slut
