Sag.: Birkedalsdvej 27, 3000 Helsingør
Sag nr.: 30025

Hovedtidsplan
Udbud

Dateret den 07.04.2017
Rev. 00

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1		**30025 - Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør**	**83 dage**	**on 19-04-17**	**fr 11-08-17**
2		Udsendelse af udbud	1 dag	on 19-04-17	on 19-04-17
3		Spørgemøde	1 dag	ma 01-05-17	ma 01-05-17
4		Aflevering af tilbud	1 dag	ma 15-05-17	ma 15-05-17
5		**Nedrivning**	10 dage	ma 05-06-17	fr 16-06-17
6		Interimsforanstaltninger	5 dage	ma 05-06-17	fr 09-06-17
7		Nedrivninger	5 dage	ma 12-06-17	fr 16-06-17
8		Affaldshåndteringer	5 dage	ma 12-06-17	fr 16-06-17
9		**Byggeplads**	40 dage	ma 12-06-17	fr 04-08-17
10		Velfærd	35 dage	ma 12-06-17	fr 28-07-17
11		Affald	35 dage	ma 12-06-17	fr 28-07-17
12		Værn	35 dage	ma 12-06-17	fr 28-07-17
13		Sikkerhed	35 dage	ma 12-06-17	fr 28-07-17
14		Rengøring	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17
15		Oprydning	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17
16		**Tømrer**	35 dage	ma 19-06-17	fr 04-08-17
17		Tømrer	20 dage	ma 19-06-17	fr 14-07-17
18		Snedker	21 dage	ma 26-06-17	ma 24-07-17
19		Fuger	15 dage	ma 10-07-17	fr 28-07-17
20		Lofter	5 dage	ma 10-07-17	fr 14-07-17
21		Gulve	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17
22		Låse	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17
23		**VVS**	5 dage	ma 12-06-17	fr 16-06-17
24		Ventilation	5 dage	ma 12-06-17	fr 16-06-17
25		**EL**	30 dage	ma 26-06-17	fr 04-08-17
26		Elektriker	20 dage	ma 26-06-17	fr 21-07-17
27		Lys	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17
28		**Maler**	15 dage	ma 17-07-17	fr 04-08-17
29		Maler	10 dage	ma 17-07-17	fr 28-07-17
30		Rengøring	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17
31		**Bygherre aflevering**	**6 dage**	**fr 04-08-17**	**fr 11-08-17**
32		Aflevering af tilbud	1 dag	fr 04-08-17	fr 04-08-17
33		Mangeludbedring	3 dage	ma 07-08-17	on 09-08-17
34		Ibrugtagning, indflytning	2 dage	to 10-08-17	fr 11-08-17

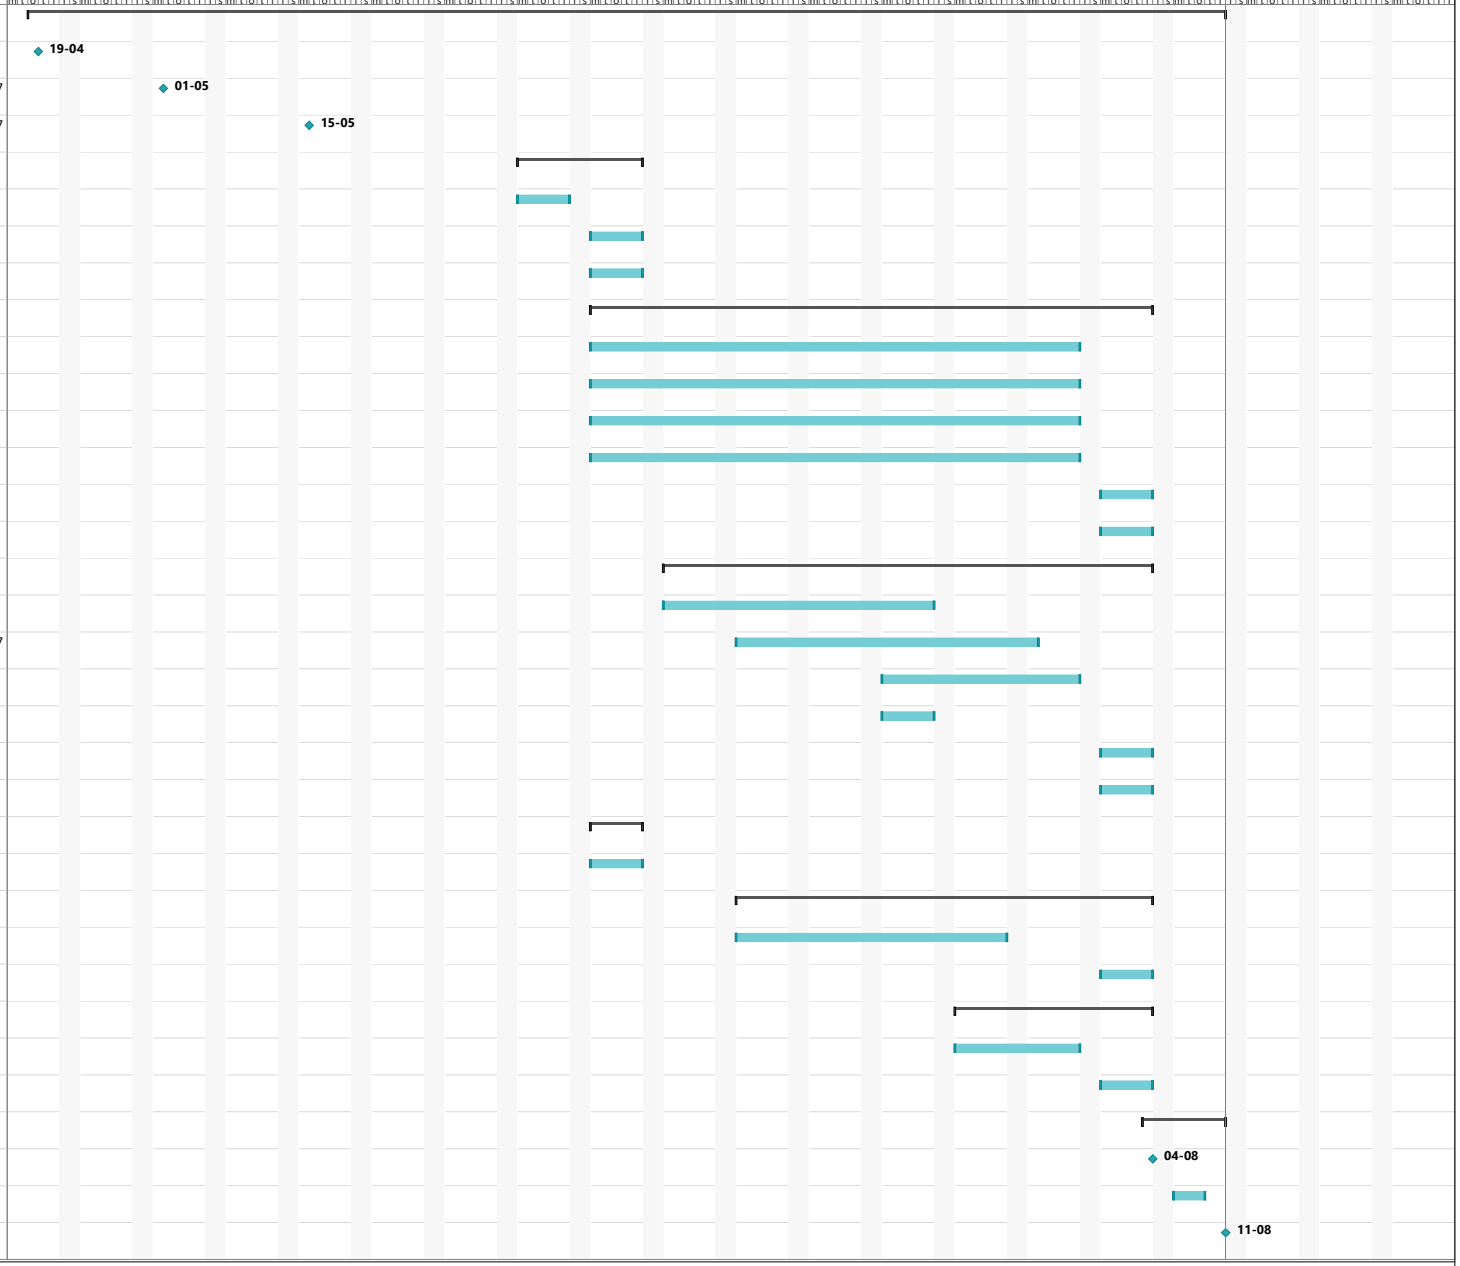

LeanDesign ApS
Ndr. Strandvej 119, B
DK - 3150 Hellebæk
